

政府信息公开项目经验交流

包头市图书馆

内 容

- * 一、完成情况
- * 二、实施经验
- * 三、存在问题

完成情况


中国政府公开信息整合服务平台

Chinese Government Public Information Online 包头市分站

- * 完成数据采集17535条
- * 采集政府单位42个
- * 数据全部通过自建方式采集，用时60天完成


实施经验

- * 运用基本的质量管理方法组织自建实施
- * 计划：制定及调整工作计划
- * 执行：进行采集工作
- * 检查：逐级审核和管理
- * 纠正：汇总问题，改进工作效能

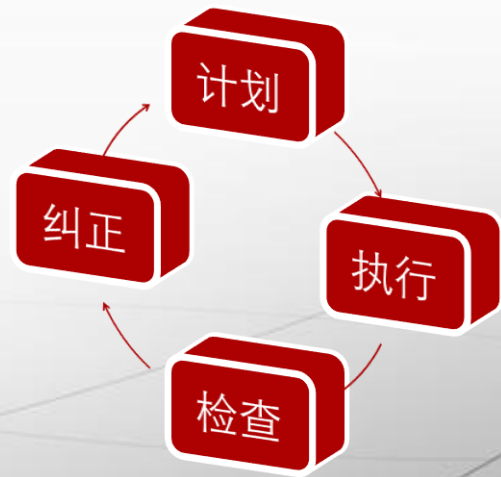

实施经验

- * 数据要求：加工数据17000条，错误率不超过1%。
- * 时间要求：2014年12月20日到2015年4月10日之间。
- * 人员要求：不影响馆内基础工作开展

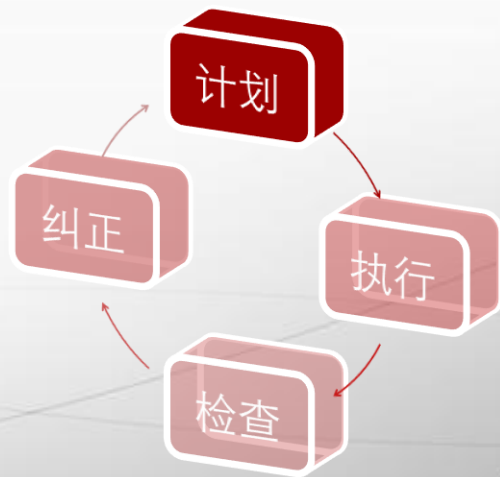

实施经验

- * 成立项目领导小组，由武咏梅副馆长任组长，成员包括信息技术部、采编部、参考咨询部的3位主任。
- * 审校、培训组由具有中高级专业水平的6名青年馆员组成。
- * 加工组由馆内志愿者和助理馆员组成，共计12人，分为2个小组。



实施经验

- * 根据加工人员加工需要，搭建了集中加工室，部署电脑终端14台，安装统一软件环境，分配60M专用网络带宽，并调配了投影机、白板等培训相关设备。




实施经验

- 统一部署系统避免了图片快照工具所依赖的运行库缺失的问题，解决了目前各捆绑浏览器对于工作的干扰。
- 网速是工作效率的重要保证，各政府单位网站由于设计局限，往往存在大量图片、Flash等影响访问速度的内容。



实施经验

- * 数据按采集目录各网站具体栏目的条数进行统计，按照50—70条的大小划分加工数据包，由专门管理人员统一管理任务包的分发、监督、送审、核算。从而有效控制进度和质量。

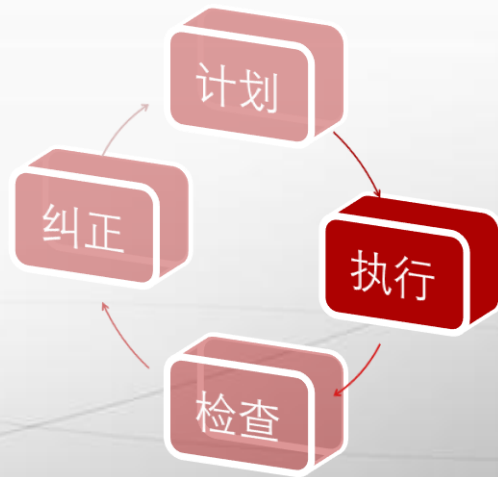

实施经验

- * 1. 许多单位往往规章或规范性文件等栏目类似，将这样的数据分配给固定的人员能提升对于这一类型数据的熟悉，提高工作效率。



实施经验

- * 2. 人民政府由于职能关系，数据内容涉及主题、关键词、文种等问题较为复杂，一般交由经验丰富的加工人员完成，从而降低错误率。



实施经验

- * 3.分配数据包多根据网站发布时间进行分割，对于同一栏目信息量特别大的情况，在分配同时标注数据所在页码范围。

序号	标题	公告日期
741	耕地后备资源调查评价工作	2014-12-12
742	耕地后备资源调查评价工作	2014-12-12
743	耕地后备资源调查评价工作	2014-12-12
744	包头市经济和信息化委员会重点用能企业能源审计及节能规划编制政府采购公开招标	2014-12-12
745	耕地后备资源调查评价工作	2014-12-12
746	包头市测绘院ArcGIS、Oracle软件公开招标_A包	2014-12-12

实施经验

一


- 加工小组间互查，逐条进行，
- 图片快照、字段缺失等基本错误排查

二

- 按数据包分配
- 关键词、分类信息的推敲

三


- 按采集单位分配
- 导出至Excel进行数据查重、查漏等

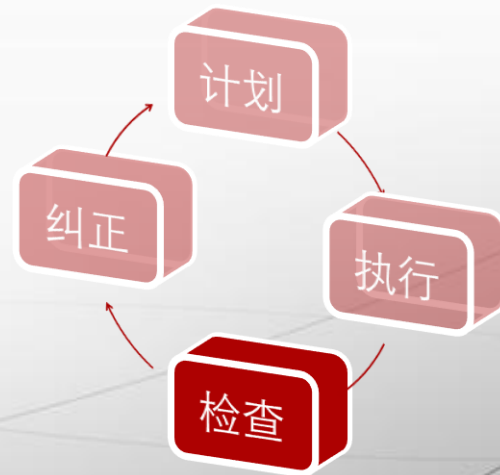

实施经验


- * 由于采集网站栏目间引用、内容重复录入等问题，数据重复在所难免，我馆采用方式是一个单位数据加工二审完成后，将数据整体导入Excel表格通过原文地址字段再次进行查重，并对其他字段进行查漏。

实施经验

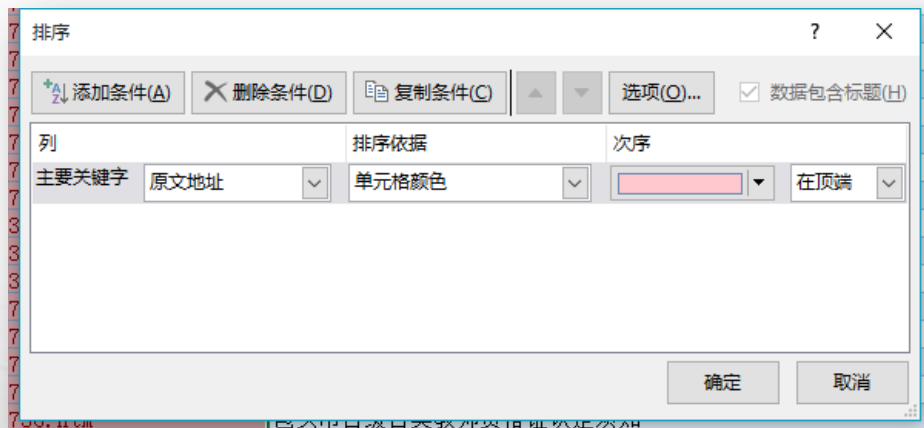

实施经验

- * 1. 汇集典型案例，明确加工标准
- * 2. 定期讨论学习，持续改进工作
- * 3. 根据针对性问题一对一讲解。

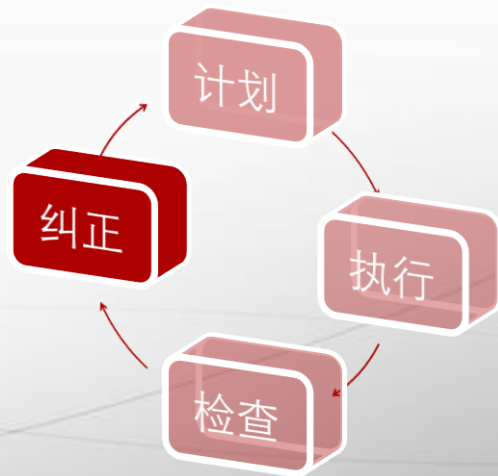

存在问题

- * 1. 包头市分站管理
- * 2. 专题资源库建设
- * 3. 服务与推广的开展



谢 谢

微信公众号：baotoulibrary
